NEVY-SUR-SEILLE

juin 2026

Commune de Nevy-Sur-Seille
Enfouissement des réseaux d'électricité et d'éclairage public
Chemin de Billin







Le contexte de l'opération :

En février 2024, la commune de Nevy-sur-Seille a sollicité le SIDEC du Jura, afin de l'accompagner dans l'enfouissement des réseaux électriques basse tension et d'éclairage public situés au-dessus du pont de Billin, en amont de sa rénovation.

L'objectif principal était d'améliorer l'intégration paysagère de cet ouvrage historique et de ses abords, en supprimant les câbles aériens visibles.

Les travaux ont été coordonnés avec la communauté de communes Bresse-Haute-Seille, maître d'ouvrage de la rénovation du pont classé, ainsi qu'avec son maître d'œuvre, Monsieur Balduini, architecte chargé de la conception et du suivi du projet de rénovation.

Le contenu de l'opération :

Travaux réalisés

- Création de réseaux souterrains électriques basse tension et d'éclairage public, sur un linéaire total de 121 mètres.
- Pose de fourreaux de protection des câbles dans le tablier du pont, avec protection métallique sous les pavés.
- Suppression d'un poteau en béton qui gênait la rénovation du mur en retour du pont.
- Remplacement de deux luminaires routiers de 100 W par des luminaires LED de 50 W, permettant de réduire de moitié la puissance installée par point lumineux, tout en améliorant la maîtrise et l'orientation de l'éclairage.


Bilan

L'opération a permis de supprimer les câbles aériens et d'améliorer l'intégration paysagère de ce site historique. Elle a également contribué à la modernisation de l'éclairage public grâce à l'installation de luminaires LED moins énergivores, offrant un éclairage mieux orienté et mieux maîtrisé.

03 84 47 04 12 contact@sidec-jura.fr
1 rue Maurice Chevassu - 39000 Lons-le-Saunier
www.sidec-jura.fr





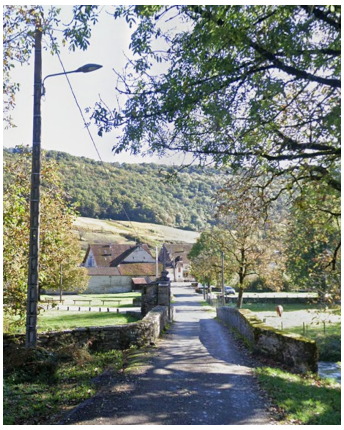



Chiffres clés :

- 89 mètres de réseaux aériens basse tension, d'éclairage public et de télécommunication enfouis
- 121 mètres de réseaux souterrains électriques basse tension et d'éclairage public créés
- 1 branchement privé repris en souterrain
- 1 poteau supprimé
- 1 mât d'éclairage public installé
- 2 luminaires remplacés

Le planning de l'opération :

- Juin 2024 : lancement de l'étude
- Mars 2025 : délibération de la commune validant le projet
- Janvier 2026 : démarrage des travaux
- Juin 2026 : réception des travaux

Les acteurs de l'opération :

SIDEC du Jura - Maître d'ouvrage :

- Création du réseau électrique basse tension souterrain
- Suppression du réseau électrique aérien

SIDEC du Jura - Maître d'ouvrage délégué :

- Création du réseau souterrain d'éclairage public
- Remplacement des luminaires d'éclairage public

Entreprise chargée des travaux :

- SPIE CITYNETWORKS

Montant de l'opération : 46 243 € HT

Réseau électrique : 40 416 € HT
Éclairage public : 5 826 € HT

Subventions :

SIDEC du Jura : 9 539 € HT
FACE : 22 916 €

Commune de NEVY-SUR-SEILLE

Monsieur le Maire

Philippe TROSSAT

mairie.nevy-sur-seille@wanadoo.fr

03 84 44 65 09

NEVY-SUR-SEILLE

SIDEC du Jura

Direction Patrimoine, Énergies et Réseaux

Pôle Réseaux Secs

dper@sidec-jura.fr

03 39 54 06 22
